

Paulista, 23 de fevereiro de 2026

Parecer nº 16/2026
Da: Controladoria Geral
Para: Secretaria de Infraestrutura - SEIN

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente, informar a V.Sa., que após análise realizada no Boletim de Medição nº 06/2028, referente aos serviços realizados pela empresa AGILIS CONSTRUTORA LTDA, **Contrato nº 250/2024**, cujo objeto é **a Execução das Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas do Município do Paulista/PE, Etapa 05 do Termo de Compromisso nº 0402.320-73/2012- Programa de Aceleração do Crescimento -PAC, do Ministério das Cidades. Atestamos os serviços físico apresentado e o financeiro no valor de R\$ 32.500,80 (trinta e dois mil, quinhentos reais e oitenta centavos), encaminhado a esta Controladoria, através do Ofício nº 225/2026- SEIN.**

Sendo assim, solicitamos desta Secretaria, anexar ao processo, o empenho e os documentos funcionais da empresa, no sentido de procedermos à análise, visando o seu encaminhamento para a devida liquidação.

Vale ressaltar que o exame realizado nesta Controladoria foi restrito ao **Boletim de Medição nº 06/2026 Contrato 250/2024**, apresentado pela Secretaria, não abrangendo decisão sobre o objeto contratado, não representando ato de gestão, mas, sim, aferição técnica de engenharia que se restringe aos aspectos de execução da obra licitada e contratada, não abarcando o conteúdo de escolhas gerenciais específicas ou mesmo elementos que fundamentaram a decisão contratual do administrador em seu âmbito discricionário.

Atenciosamente,


Alfredo Aguiar
Supervisor de Obras de Engenharia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paulista/PE, 12 de fevereiro de 2026.

C.I. Nº 080/2026 - SEIN

DE: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PARA: GABINETE DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO: Contrato nº 250/2024 – Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de contenção de encostas em áreas urbanas no Município do Paulista/PE, Etapa 5 do Termo de Compromisso nº 0402.320-73/2012, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Ministério das Cidades.

Prezado(a) senhor(a),

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desta, encaminhar a documentação do **BM-06**, referente ao período de **01/01/2026 até 31/01/2026**, do contrato acima citado para análise e posterior aprovação perante a controladoria. O valor da medição é de **R\$ 32.500,80** (trinta e dois mil quinhentos reais e oitenta centavos). A empresa executora, conforme contrato, é a AGILIS CONSTRUTORA LTDA.

Referências:

- Valor Total do Contrato: R\$ 1.229.998,11
- Valor do BM-06: R\$ 32.500,80

Seguem em anexo:

- BM-06 Completo;
- Memória de Cálculo;
- Relatório Fotográfico;
- Diário de Obras;
- AS BUILT.

Atenciosamente,

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 1822454069 PE

Edvaldo Soares do Nascimento

Fiscal de Obras

Mat. 48.529

Ilmo (a). Sra.

Jaina Poesi da Silva Gonzaga

Secretária Executiva de Infraestrutura – Paulista/PE



PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paulista, 12 de fevereiro de 2026.

OFÍCIO Nº 0225 / 2026 - SEIN

Prezado Controlador:

Com base nas informações da fiscalização, vimos por meio do presente encaminhar em anexo o Boletim de Medição nº 06 no valor R\$ 32.500,80 (Trinta e dois mil, quinhentos reais e oitenta centavo) CONTRATO Nº 250/2024, firmado com a Empresa AGILIS CONSTRUTORA LTDA, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁRES URBANA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 5 DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0402.320-73/2012 – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC DO MNISTÉRIO DAS CIDADES para análise e atesto do pagamento.

- Boletim de Medição nº 06 – BM 06 – R\$ 32.500,80;
- Memória de cálculo;
- Relatório fotográfico;
- Diário de Obra;
- CI nº 080/2026 – Departamento de Fiscalização de Obras.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

JANIA POESÍ DA SILVA GONZAGA
Secretária Executiva de Infraestrutura

Ilmo. Sr.
GUSTAVO PAULO DE MIRANDA DE A. FILHO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

ANÁLISE DO BOLEM DE MEDIÇÃO 06

AGILIS CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATO Nº 250/2024.

OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSOS - 5ª ETAPA

PERÍODO - 01/01/2026 A 31/01/2026.

= CONSOLIDAÇÃO DO BM 06 S/ ADMINISTRAÇÃO.

- ITEM 1.2 - OBRAS DE CONTEÚO.

1.2.1 - Locação da Obra - - 412,46 /

$$26,82 \times 15,39 = 412,46$$

1.2.2 - Regularização / Compactação - - 110,50 /

$$7,18 \times 15,39 = 110,50$$

1.2.3 - Escavação Manual - - 1.326,31 /

$$86,18 \times 15,39 = 1.326,31$$

1.2.4 - Transporte Horizontal - - 754,25 /

$$65,36 \times 11,54 = 754,25$$

1.2.6 - Fornecimento e Assalt Bita 2 - - 448,36 /

$$131,10 \times 3,42 = 446,36$$

1.2.7 - Tubo PVC Ø 25mm. - - 161,17 /

$$16,28 \times 9,90 = 161,17$$

1.2.8 - Fornecimento Manta Bidim - - 3,89 /

$$27,76 \times 0,14 = 3,89$$

1.2.9 - Concreto não Estrutural - - 508,29 /

$$660,12 \times 0,77 = 508,29$$

1.2.11 - Armadura de Rede Lado - - 27.822,37 /

$$546,51 \times 48,26 = 27.822,37$$

- TOTAL DO BM 06 S/ ADMINISTRAÇÃO - R\$ 31.547,90.

(continuação da análise do BM 6-Agiles)

2

- Cálculo da Administração Local -

- Valor do Contrato 250/2024 - 1.229.998,11 -
- Valor da Adm. Contratual - 35.433,48
- Valor do Contrato $\pm$ /Adm - 1.194.264,33
- Prazo de Execução - 6,0 meses
- Valor do BM 06 $\pm$ /Adm - 31.547,90

Termos:

$$\frac{x}{6,0} = \frac{31.547,90}{1.194.264,33} \rightarrow x = \frac{6,0 \times 31.547,90}{1.194.264,33} \rightarrow$$

$$x = \frac{189.287,40}{1.194.264,33} \rightarrow x = 0,1584. \rightarrow x = 0,16.$$

- Valor da Administração Local -

$$\text{- Valor Unitário da Adm} \times 0,16 = 5.955,63 \times 0,16 = \text{R\$ } 952,90.$$

- Valor do BM 06 com Adm. local.

$$\text{- Valor do BM 06 $\pm$ /Adm} + \text{Valor da Administração} =$$

$$- 31.547,90 + 952,90 = \text{R\$ } 32.500,80.$$

PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA		Nº OPERAÇÃO 0402.320-73/2012		Nº SICONV 0		APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/01/2026 a 31/01/2026		INÍCIO DE OBRA 09/07/25	
Nº CTEF 250/2024		EMPRESA EXECUTORA AGILIS CONSTRUTORA LTDA		CNPJ 10.893.105/0001-70		REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				Nº MEDIÇÃO 6	

Realizado Acumulado: 30,83%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Atde.)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período		
Objeto do CTEF: OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA					TOTAL:	-	-	-	346.698,55	32.500,80	379.199,35		
1.1.	OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA	0	-	-	1.229.998,11	-	-	-	346.698,55	32.500,80	379.199,35		
1.1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	-	-	-	25.350,92	-	-	-	5.398,30	-	5.398,30		
1.1.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E	M2	6,00	343,53	2.061,18	6,00	-	6,00	2.061,18	-	2.061,18		
1.1.3.	ALUGUEL CONTAINERESCRIPTÓRIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA,	MES	6,00	748,38	4.490,28	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	12,00	695,46	8.345,52	-	-	-	-	-	-		
1.1.5.	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM	M2	136,60	10,21	1.394,69	-	-	-	-	-	-		
1.1.6.	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO - INCLUSIVE TRANSPORTE	MES	6,00	874,33	5.245,98	-	-	-	-	-	-		
1.2.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	M2	823,60	4,63	3.813,27	720,76	-	720,76	3.337,12	-	3.337,12		
1.2.1.	OBRAS E CONTENÇÃO	-	-	-	973.087,81	-	-	-	330.815,51	31.547,90	362.363,41		
1.2.2.	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS,	M2	1.233,00	26,82	33.069,06	264,91	15,39	280,30	7.104,89	412,76	7.517,65		
1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO, COM SOQUETE,	M2	823,20	7,18	5.910,58	147,54	15,39	162,93	1.059,34	110,50	1.169,84		
1.2.4.	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M (BASEADA	M3	1.195,60	86,18	103.036,81	234,45	15,39	249,84	20.204,90	1.326,31	21.531,21		
1.2.5.	REMOÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.494,50	65,36	97.680,52	281,60	11,54	293,14	18.405,38	754,25	19.159,63		
1.2.6.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - DRENOS E FILTROS	M3	1.494,50	17,11	25.570,90	-	3,42	6,14	356,59	448,36	804,95		
1.2.7.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E	M	609,76	16,28	9.926,89	98,30	9,90	108,20	1.600,32	161,17	1.761,49		
1.2.8.	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-31 (BASEADO NA	M2	2,84	27,76	78,84	0,27	0,14	0,41	7,50	3,89	11,39		
1.2.9.	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM	M3	41,16	660,12	27.170,54	4,71	0,77	5,48	3.109,17	508,29	3.617,46		
1.2.10.	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO,	M3	324,00	63,87	20.693,88	-	-	-	-	-	-		
1.2.11.	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM	M3	1.089,97	576,51	628.378,60	483,89	48,26	532,15	278.967,42	27.822,37	306.789,79		
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	42.430,69	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	409,80	2,34	958,93	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	M2	409,80	83,13	34.066,67	-	-	-	-	-	-		
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	136,60	54,21	7.405,09	-	-	-	-	-	-		
1.4.	DRENAGEM	-	-	-	74.935,04	-	-	-	-	-	-		
1.4.1.	MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM (BASEADA NA	M	269,60	65,28	17.599,49	30,15	-	30,15	1.968,19	-	1.968,19		
1.4.2.	CAIXA COLETOIRA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE	UN	3,00	1.897,71	5.693,13	-	-	-	1.968,19	-	1.968,19		
1.4.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	25,00	356,86	8.921,50	-	-	-	-	-	-		
1.4.4.	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM COM	M2	386,30	110,59	42.720,92	-	-	-	-	-	-		
1.5.	SERVIÇOS EXTRAS	-	-	-	78.459,87	-	-	-	-	-	-		
1.5.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,	M	137,50	443,18	60.937,25	-	-	-	-	-	-		
1.5.2.	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	M2	275,00	51,56	14.179,00	-	-	-	-	-	-		
1.5.3.	LIMPEZA FINAL DA OBRA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 9537 SINAPI	M2	796,10	4,20	3.343,62	-	-	-	-	-	-		
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-	35.733,78	-	-	-	8.516,55	952,90	9.469,45		
1.6.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	5.955,63	35.733,78	1,43	0,16	1,59	8.516,55	952,90	9.469,45		

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PM3.0.4

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 182245/069 PE

AGILIS CONSTRUTORA
Homero Bandão Pittencourt
CREA-PE 1819703312 Reg. Nacional



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA		Nº OPERAÇÃO 00402.320-73/2012		Nº SICONV 0		APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA		INÍCIO DE OBRA 09/07/25	
Nº CTEF 250/2024	EMPRESA EXECUTORA AGILIS CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 10.893.105/0001-70	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/01/2026 a 31/01/2026		Nº MEDIÇÃO 6		

Realizado Acumulado: 30,83%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BD) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA						TOTAL:			346.698,55	32.500,80	379.199,35

PAULISTA/PE

Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

Data

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-PE 1822454069-PE
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDVALDO SOARES DO NASCIMENTO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 1822454069 PE
ART/RT: PE20251436161

AGILIS CONSTRUTORA
Homero Brandão Bittencourt
CREA-PE 1819703312 Reg. Profissional



MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 06

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

250/2024

BM

06

BM-Data emissão

28-01-2026

Período da medição

até 31-01-2026

Nº do CR

0402.320-73/2012

Início da obra-data

09-07-2025

Previsão término da obra

04-01-2026

Empresa Contratada

AGILIS CONSTRUTORA LTDA

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador

Prefeitura Municipal do Paulista

CTEF-Valor total inicial (R\$)

1.229.998,11

CTEF-dt assinatura

05-11-2024

Objeto do CTEF (resumido)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 5

Agente Financeiro ou Operador Repasse

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CTEF-Valor total atual (R\$)

1.229.998,11

CTEF- Dt último adit

-

Local da obra (Bairro / Município / UF)

ARTHUR LUNDGREEN II - PAULISTA/PE

1.2 OBRAS E CONTENÇÃO

1.2.1

Composição LOCALIZAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 73686 SINAPI JULHO/2015)

CONTRATO 1.233,00 M2

ESTACA

(LARG. m

(1,80 m

+ LARG. m

+ 1,80 m

) / 2,00

= LARG. MÉDIA m

= 1,80 m

COMP m

x LARG média m

x 1,80 m

= 15,39 m²

ÁREA DA BASE

E03+ 9,50 - E03+ 0,95

COMP m

x LARG média m

x 1,80 m

= 15,39 m²

TOTAL EXECUTADO = 248,64 m²

MEDIDO NESTE BM 01 = 43,32 m²

MEDIDO NESTE BM 02 = 21,87 m²

MEDIDO NESTE BM 03 = 17,55 m²

MEDIDO NESTE BM 04 = 139,17 m²

MEDIDO NESTE BM 05 = 11,34 m²

MEDIDO NESTE BM 06 = 15,39 m²

SALDO = 984,36 m²

1.2.2

Composição REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO, COM SOQUEITE (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 5622 SINAPI JULHO/2015)

CONTRATO 823,20 M2

ESTACA

(LARG. m

(1,80 m

+ LARG. m

+ 1,80 m

) / 2,00

= LARG. MÉDIA m

= 1,80 m

COMP m

x LARG média m

x 1,80 m

= 15,39 m²

ÁREA DA BASE

E03+ 9,50 - E03+ 0,95

COMP m

x LARG média m

x 1,80 m

= 15,39 m²

TOTAL EXECUTADO = 162,93 m²

MEDIDO NESTE BM 01 = 43,32 m²

MEDIDO NESTE BM 02 = 21,87 m²

MEDIDO NESTE BM 03 = 17,55 m²

MEDIDO NESTE BM 04 = 53,46 m²

MEDIDO NESTE BM 05 = 11,34 m²

MEDIDO NESTE BM 06 = 15,39 m²

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 18224540659 PE

AGILIS CONSTRUTORA
Homero Brito Brito
CREA-PE 1819703312 Reg. Nacional



MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 06									
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM	BM-Data emissão		Período da medição		Nº do CR		
250/2024		06	28-01-2026		01-01-2026 até 31-01-2026		0402.320-73/2012		
Início da obra-data		Previsão término da obra	Empresa Contratada		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador				
09-07-2025		04-01-2026	AGILIS CONSTRUTORA LTDA		Prefeitura Municipal do Paulista				
CTEF-Valor total inicial (R\$)		CTEF-dt assinatura	Objeto do CTEF (resumido)		Agente Financeiro ou Operador				
1.229.998,11		05-11-2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/ PE, ETAPA 5		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CTEF-Valor total atual (R\$)		CTEF- Dt último adit	Local da obra (Bairro / Município / UF)						
1.229.998,11		-	ARTHUR LUNDGREEN II - PAULISTA/PE						
SALDO		=	660,27		m²				
1.2.3		SINAPI		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		CONTRATO		1.195,60	M3
ESTACA		ÁREA DA BASE DO MURO (m³)							
(COMP. m x PROF. m x LARG. m)									
E03+ 9,50 - E03+ 0,95 (8,55 m x 0,75 m x 2,40 m)								15,39	m³



MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 06																	
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM	BM-Data emissão		Período da medição			Nº do CR									
250/2024		06	28-01-2026		01-01-2026 até 31-01-2026			0402.320-73/2012									
Início da obra-data		Previsão término da obra	Empresa Contratada			Tomador/Ag. Promotor ou Tomador											
09-07-2025		04-01-2026	AGILIS CONSTRUTORA LTDA			Prefeitura Municipal do Paulista											
CTEF-Valor total inicial (R\$)		CTEF-dt assinatura	Objeto do CTEF (resumido)					Agente Financeiro ou Operador									
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 5					Repasse									
CTEF-Valor total atual (R\$)		05-11-2024	Local da obra (Bairro / Município / UF)					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
1.229.998,11		CTEF- Dt último adit	ARTHUR LUNDGREEN II - PAULISTA/PE														
1.229.998,11																	
1.2.9																	
Composição		CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 6042 SINAPI JULHO/2015)										CONTRATO	41,16	M3			
ESTACA		MÉDIA DAS LARGURAS DA BASE (m)															
(LARG. m x COMP. m x ESP. m)																	
E03+ 9,50 - E03+ 0,95 (1,80 m x 8,55 m x 0,05 m)														0,77	m³		
													TOTAL EXECUTADO	=	5,48	m³	
													MEDIDO NESTE BM 01	=	2,16	m³	
													MEDIDO NESTE BM 02	=	1,10	m³	
													MEDIDO NESTE BM 03	=	0,88	m³	
													MEDIDO NESTE BM 04	=	0,00	m³	
													MEDIDO NESTE BM 05	=	0,57	m³	
													MEDIDO NESTE BM 06	=	0,77	m³	
													SALDO	=	35,68	m³	
1.2.11													CONTRATO	1,089,97	M3		
Composição		ALVENARIA EM PEDRA RACHADO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74053/001 SINAPI JULHO/2015)															
ESTACA		ÁREA DA BASE DO MURO (m²)															
(COMP. m x PROF. m x LARG. m)																	
E03+ 9,50 - E03+ 0,95 (8,55 m x 0,70 m x 1,70 m)		Larg. m + Larg. m / 2,00 = 1,35												10,17	m³		
ESTACA		ÁREA 01 MURO - MAIOR (m²)															
(COMP. m x ALT. m x LARG. m)																	
E03+ 9,50 - E03+ 0,95 (8,55 m x 3,30 m x 1,35 m)														38,09	m³		
													TOTAL EXECUTADO	=	532,15	m³	
													MEDIDO NESTE BM 01	=	128,24	m³	
													MEDIDO NESTE BM 02	=	63,24	m³	
													MEDIDO NESTE BM 03	=	74,54	m³	
													MEDIDO NESTE BM 04	=	150,51	m³	
													MEDIDO NESTE BM 05	=	67,36	m³	
													MEDIDO NESTE BM 06	=	48,26	m³	
													SALDO	=	557,82	m³	
1.6		ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
1.6.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											CONTRATO	6,00	MÊS		
Composição		Valor do do Contrato - V.CT. (R\$)										FATOR K =	V.M.BM02 S/A. (R\$)	/	V.CT.S/A.L. (R\$)	=	0,026
		Valor da Administração Local (ITEM 1.6.1) - V.A.L.(R\$)										FATOR K =	31,547,91	/	1.194,264,33	=	
		Valor do Contrato sem Administração Local - V. CT.S/A.L.(R\$)															
		Medido Neste BM S/ADM - M.BM S/A. (R\$)															
		FATOR K = valor do BM sem ADM / Valor do contrato sem ADM															

**CAIXA**Página 5 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 06

Objeto: OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

Contrato 250/2024 **OS** 002/2025 **Termo Compromisso Nº** 0402.320-73/2012

Endereço ARTHUR LUNDGREEN II - PAULISTA/PE

Responsável Técnico HOMERO BRANDÃO BITTENCOURT

CREA/CAU 1819703312PE

Ref. ao Período

Responsável HOMERO BRANDÃO BITTENCOURT

Função Engº Civil

05/01/26 a 09/01/2026

Início da Obra 09/07/2025

Término da Obra 04/01/2026

Condição do tempo	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL	Dia da Visita - 06/01/2026						
MANHÃ	X	-	-	-							
TARDE	X	-	-	-							
NOITE	-	-	-	-							
					Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					○	○	○	○	○	○	○
Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia			
Quantidade	1	1	-	1	-	-	9				
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Furadeira	Retro-Escav.	Cam. Munk			
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-			

Atividades Realizadas

Descrição	Observação
SERVIÇO REFERENTE A ESTACA E03'+9,50 - E03'+ 0,95	

Ocorrências

Descrição	Tipo de Ocorrência
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO MURO PARA EXECUÇÃO; ESCAVAÇÃO DE VALA COM 75 CM DE PROFUNDIDADE, 1,70 M DE LARGURA E 8,55 M DE EXTENSÃO PARA EXECUÇÃO DA BASE DO MURO; COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA EXECUÇÃO DO CONCRETO MAGRO COM 5 CM DE ESPESSURA.	

Comentários

Imagens



FOTO 01
Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 1822454069 PE



FOTO 02

Fiscalização: Edvaldo Soares - Mat. 48.529

AGILIS CONSTRUTORA
Homero Brandão Bittencourt
AGILIS CONSTRUTORA LTDA

HOMERO BRANDÃO BITTENCOURT

Eng.º Civil - CREA: 1819703312PE

Secretária Executiva - Jaina Poesi S. Gongaza



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 06

Objeto: OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

Contrato 250/2024 OS 002/2025 Termo Compromiso Nº 0402.320-73/2012

Endereço ARTHUR LUNDGREEN II - PAULISTA/PE

Responsável Técnico HOMERO BRANDÃO BITTENCOURT

CREA/CAU 1819703312PE

Ref. ao Período

Responsável HOMERO BRANDÃO BITTENCOURT

Função Engº Civil

12/01/26 a 16/01/2026

Início da Obra 09/07/2025

Término da Obra 04/01/2026

Condição do tempo	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL	Dia da Visita - 12/01/2026 e 16/01/2026				
MANHÃ	X	-	-	-	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui
TARDE	X	-	-	-					
NOITE	-	-	-	-					
Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia	
Quantidade	1	1	-	1	-	-	9		
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Furadeira	Retro-Escav.	Cam. Munk	
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-	

Atividades Realizadas

Descrição	Observação
SERVIÇO REFERENTE A ESTACA E03'+9,50 - E03'+ 0,95	

Ocorrências

Descrição	Tipo de Ocorrência
SERVIÇO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DA BASE DO MURO; EXECUÇÃO DE BASE DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO E ARGAMASSA, COM 70 CM DE PROFUNDIDADE E 1,70 M DE LARGURA; COLOCAÇÃO DE BRITA PARA FILTRAGEM DA ÁGUA; COLOCAÇÃO DE TUBO DE ESGOTO COM 75 MM E BIDIM PARA FECHAMENTO DE UM DOS LADOS DO TUBO.	

Comentários

Imagens



FOTO 01



FOTO 02

Edvaldo Soares do Nascimento

Engenheiro Civil

CREA 1819703312PE

Fiscalização: Edvaldo Soares - Mat. 48.529

AGILIS CONSTRUTORA

Homero Brandão Bittencourt

AGILIS CONSTRUTORA LTDA

HOMERO BRANDÃO BITTENCOURT

Eng.º Civil - CREA: 1819703312PE

Secretária Executiva - Jaina Poesi S. Gongaza

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 06

Objeto: OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

Contrato 250/2024 **OS** 002/2025 **Termo Compromisso Nº** 0402.320-73/2012

Endereço ARTHUR LUNDGREEN II - PAULISTA/PE

Responsável Técnico HOMERO BRANDÃO BITTENCOURT **CREA/CAU** 1819703312PE **Ref. ao Período**

Responsável HOMERO BRANDÃO BITTENCOURT **Função** Engº Civil **19/01/2026 a**

Início da Obra 09/07/2025 **Término da Obra** 04/01/2026 **23/01/2026**

Condição do tempo	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL	Dia da Visita - 19/01/2026 e 23/01/2026						
MANHÃ	X	X	-	-	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
TARDE	X	-	-	-	○	○	●	(○	○	○	○
NOITE	-	-	-	-							

Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia
Quantidade	1	1	-	1	-	-	9	
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Furadeira	Retro-Escav.	Cam. Munk
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-

Atividades Realizadas

Descrição	Observação
SERVIÇO REFRENTE A ESTACA E03'+9,50 - E03'+ 0,95	

Ocorrências

Descrição	Tipo de Ocorrência
EXECUÇÃO DE BASE DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO E ARGAMASSA, COM 70 CM DE PROFUNDIDADE E 1,70 M DE LARGURA; COLOCAÇÃO DE BRITA PARA FILTRAGEM DA ÁGUA; COLOCAÇÃO DE TUBO DE ESGOTO COM 75 MM E BIDIM PARA FECHAMENTO DE UM DOS LADOS DO TUBO. EXECUÇÃO DO MURO EM PEDRA RACHÃO COM ARGAMASSA, COM APROXIMADAMENTE 3,30 M DE ALTURA, LARGURA INFERIOR DE 1,70 M E LARGURA SUPERIOR DE 1,00 M.	

Comentários

Imagens



FOTO 01



FOTO 02

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 1822454069 PE

Fiscalização: Edvaldo Soares - Mat. 48.529

AGILIS CONSTRUTORA
Homero Brandão Bittencourt

AGILIS CONSTRUTORA LTDA
HOMERO BRANDÃO BITTENCOURT
Eng.º Civil - CREA: 1819703312PE

Secretária Executiva - Jaina Poesi S. Gongaza

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 06

Objeto: OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

Contrato 250/2024 **OS** 002/2025 **Termo Compromisso Nº** 0402.320-73/2012

Endereço ARTHUR LUNDGREEN II - PAULISTA/PE

Responsável Técnico HOMERO BRANDÃO BITTENCOURT

CREA/CAU 1819703312PE

Ref. ao Período

Responsável HOMERO BRANDÃO BITTENCOURT

Função Engº Civil

26/01/2026 a

Início da Obra 09/07/2025

Término da Obra 04/01/2026

30/01/2026

Condição do tempo	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL	Dia da Visita -							
MANHÃ	X	X	X	-	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	
TARDE	X	X	X	-	○	○	○	(●)	○	○	○	
NOITE	-	-	-	-								
Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia				
Quantidade	1	1	-	1	-	-	9					
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Furadeira	Retro-Escav.	Cam. Munk				
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-				

Atividades Realizadas

Descrição	Observação
SERVIÇO REFERENTE A ESTACA E03'+9,50 - E03'+ 0,95	

Ocorrências

Descrição	Tipo de Ocorrência
EXECUÇÃO DE BASE DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO E ARGAMASSA, COM 70 CM DE PROFUNDIDADE E 1,70 M DE LARGURA; COLOCAÇÃO DE BRITA PARA FILTRAGEM DA ÁGUA; COLOCAÇÃO DE TUBO DE ESGOTO COM 75 MM E BIDIM PARA FECHAMENTO DE UM DOS LADOS DO TUBO. EXECUÇÃO DO MURO EM PEDRA RACHÃO COM ARGAMASSA, COM APROXIMADAMENTE 3,30 M DE ALTURA, LARGURA INFERIOR DE 1,70 M E LARGURA SUPERIOR DE 1,00 M.	

Comentários

Imagens



FOTO 01



FOTO 02

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 1822454069 PE

Fiscalização: Edvaldo Soares - Mat. 48.529

AGILIS CONSTRUTORA
Homero Brandão Bittencourt

CREA PE 1819703312 Reg. Nacional
AGILIS CONSTRUTORA LTDA

HOMERO BRANDÃO BITTENCOURT
Eng.º Civil - CREA: 1819703312PE

Secretária Executiva - Jaina Poesi S. Gonzaga

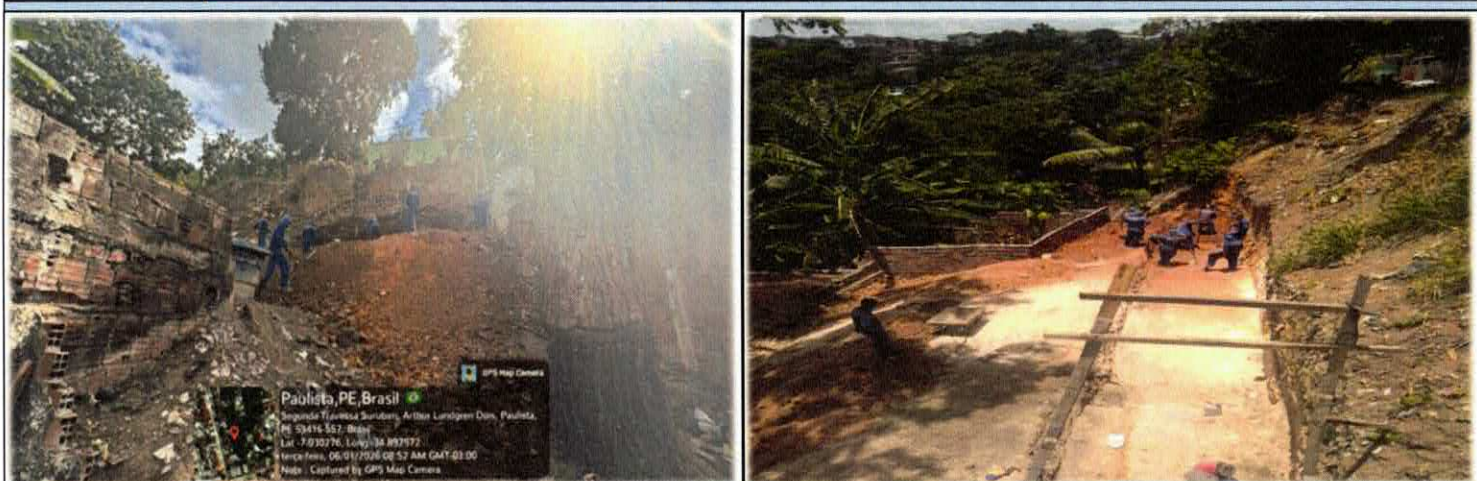


Foto n. 01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

Foto n. 02

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA VALA.

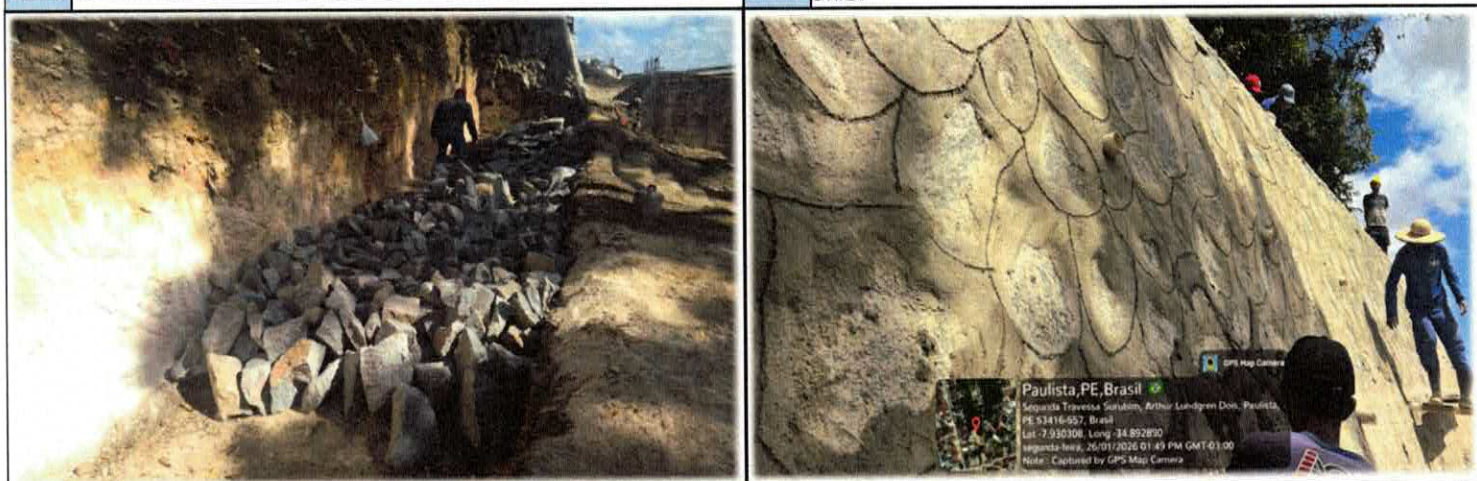


Foto n. 03

EXECUÇÃO DA BASE DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO.

Foto n. 04

EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO, COM TRAÇO DE ARGAMASSA.



Foto n. 05

EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO, COM TRAÇO DE ARGAMASSA, COM COLOCAÇÃO DE BARBACÁ NO MURO DE CONTENÇÃO.

Foto n. 06

EXECUÇÃO DO TRAÇO DE ARGAMASSA PARA CONFEÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO.

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 1872454069 PE
SEINFRA - PREFEITURA DO PAULISTA.
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização).

AGILIS CONSTRUTORA
Homero B. Andão Bittencourt
CREA-PE 1872454069
Responsável Técnico da Empresa.
