

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 10

ASSUNTO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

CONTRATO: 135/2024

PERÍODO: 23/10/2025 A 30/11/2025

LOTE 03: 8



1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BRUNA PATRICIA DE
OLIVEIRA
NASCIMENTO:0918558
8407

Assinado de forma digital por
BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA
NASCIMENTO:09185588407
Dados: 2025.12.05 13:03:20
-03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 10

ASSUNTO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

CONTRATO: 135/2024

PERÍODO: 23/10/2025 A 30/11/2025

LOTE 03: 8



1.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018(FOTO ANTES DA LIMPEZA CASA Nº 86).



Paulista, Pernambuco, Brasil 
R. Vinte E Cinco, Paulista, Pernambuco 53444-300, Brasil
25M S 293612,11 9120691,19
29/10/2025 02:41 PM

 **GPS Map Camera**
 **29.93° C**
 **207° SW**

1.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018(FOTO DEPOIS DA LIMPEZA CASA Nº 86).

**BRUNA PATRICIA
DE OLIVEIRA
NASCIMENTO:091
85588407**

Assinado de forma digital
por BRUNA PATRICIA DE
OLIVEIRA
NASCIMENTO:09185588407
Dados: 2025.12.05 13:02:45
-03'00'


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 10

ASSUNTO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

CONTRATO: 135/2024

PERÍODO: 23/10/2025 A 30/11/2025

LOTE 03: 8

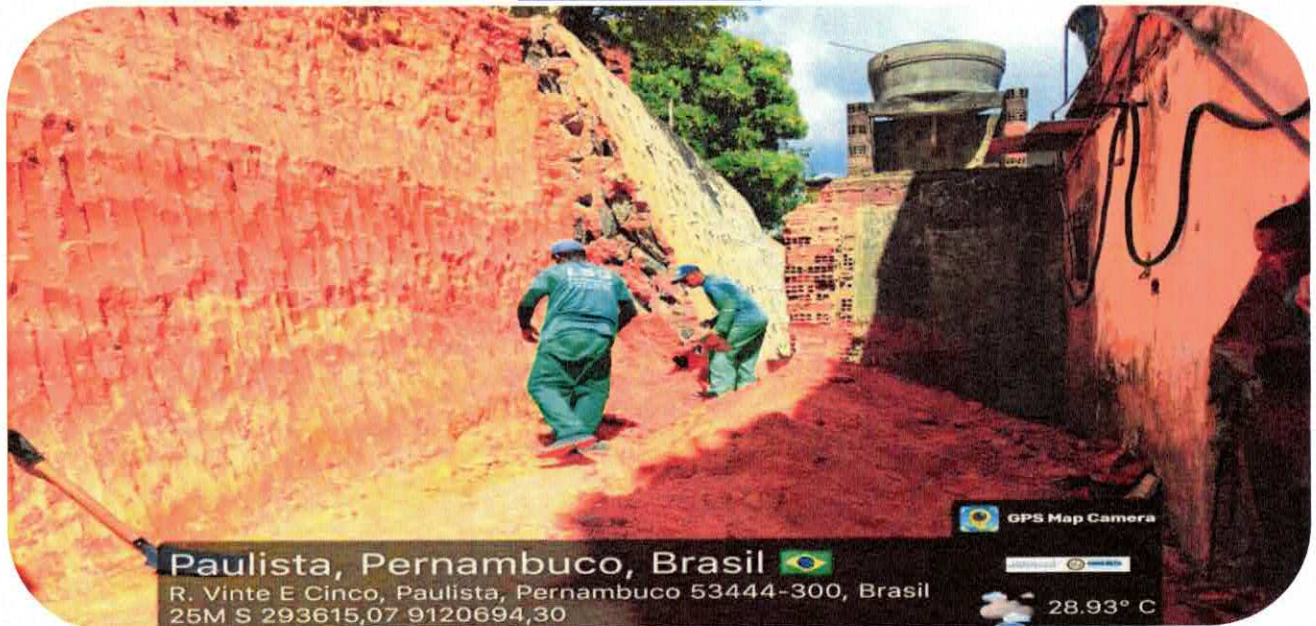

1.2.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021. (CASA Nº 86)



1.2.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (CASA Nº 86).

BRUNA PATRICIA
DE OLIVEIRA
NASCIMENTO:0918
5588407

Assinado de forma digital por
BRUNA PATRICIA DE
OLIVEIRA
NASCIMENTO:09185588407
Dados: 2025.12.05 13:02:21
-03'00'


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 10

ASSUNTO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

CONTRATO: 135/2024

PERÍODO: 23/10/2025 A 30/11/2025

LOTE 03: 8

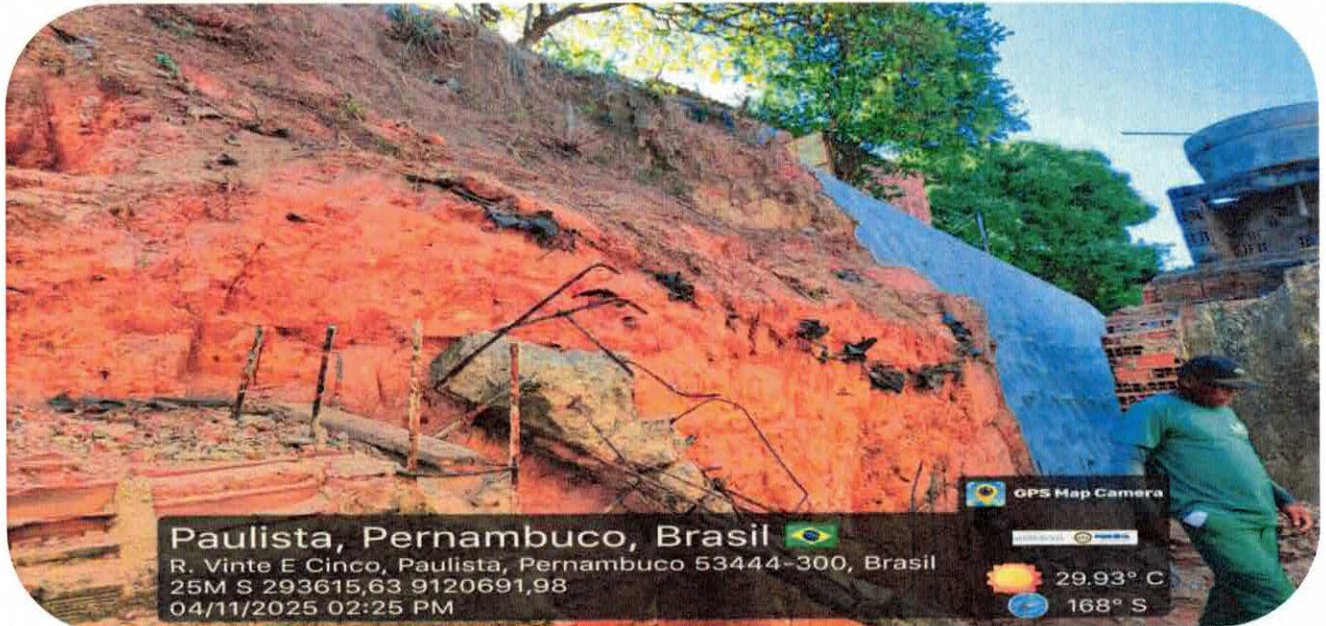

1.2.5 DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO (CASA Nº 86).



1.2.6. TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M (CASA Nº 86).

1.2.7. CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA (CASA Nº 86).


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 10

ASSUNTO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.


CONTRATO: 135/2024

PERÍODO: 23/10/2025 A 30/11/2025

LOTE 03: 8

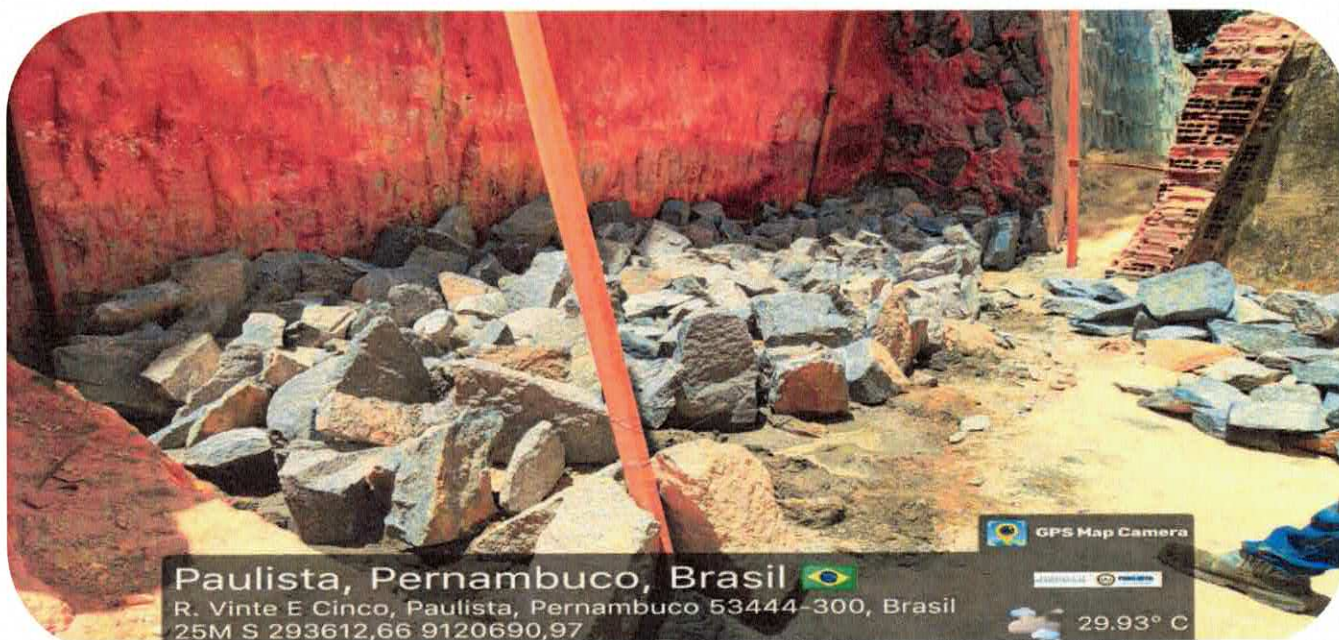

1.2.11. ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (CASA Nº 86).

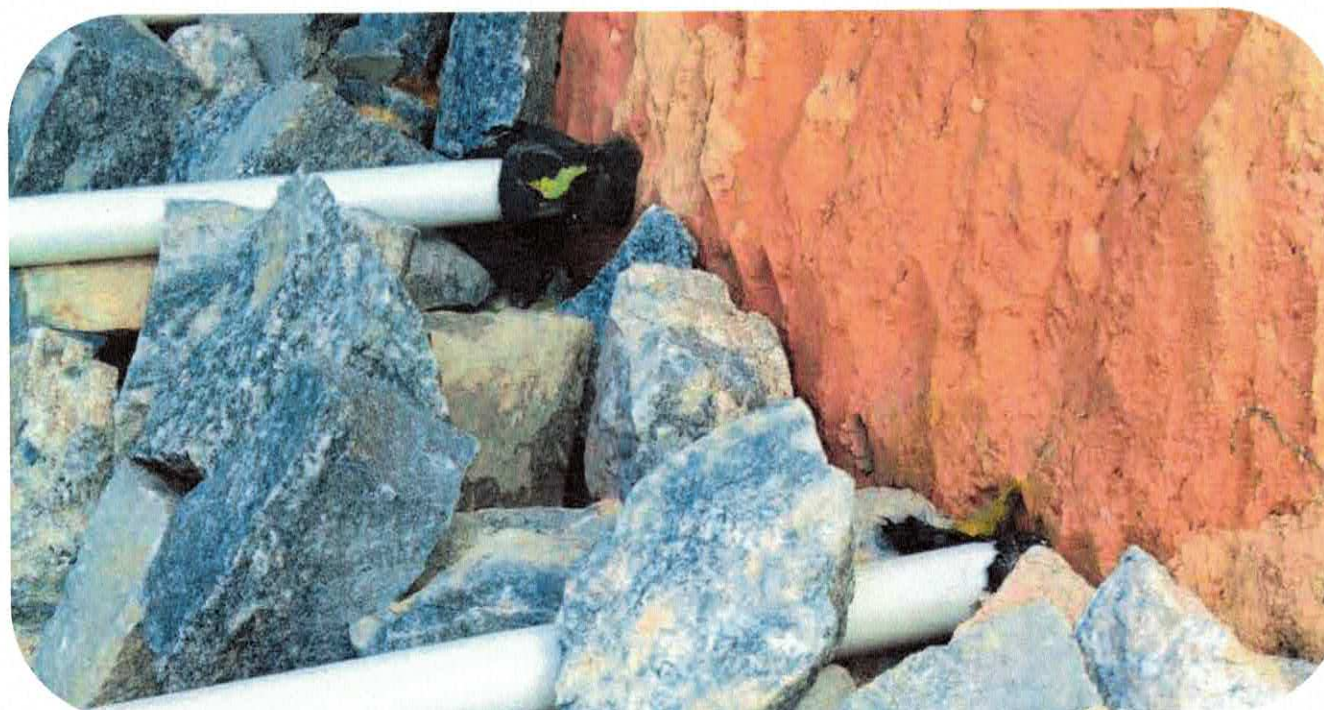

1.2.13. FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-31 (CASA 76).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 10

ASSUNTO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

CONTRATO: 135/2024

PERÍODO: 23/10/2025 A 30/11/2025

LOTE 03: 8



1.2.14. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022. (CASA Nº76)



1.3.1. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM. (CASA Nº 56)

**BRUNA PATRICIA
DE OLIVEIRA
NASCIMENTO:091
85588407**

Assinado de forma digital
por BRUNA PATRICIA DE
OLIVEIRA
NASCIMENTO:09185588407
Dados: 2025.12.05 13:01:07
-03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 10

ASSUNTO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

CONTRATO: 135/2024

PERÍODO: 23/10/2025 A 30/11/2025

LOTE 03: 8



1.3.1. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM. (CASA Nº 66 a 76).



1.3.2 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO.

Página 7 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 10

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 2 DAS ÁREAS DE OBRAS 6N, 7N E 08.

Contrato 135/2024 **OS** 007/2024 **Convênio** 0402.320-73/2012

Endereço VILA TORRES GALVÃO E MARANGUAPE I.

Responsável Técnico BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **CREA/CAU** 1819500357PE **Ref. ao Período**

Responsável BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Função** Eng^a Civil **20/10/2025 a**

Início da Obra 13/06/2024 **Término da Obra** 12/12/2025 **24/10/2025**

Condição do tempo	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL	Dia da Visita - 21/10/2025 e 23/10/2025							
MANHÃ	X	-	-	-	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	
TARDE	-	-	-	-	○	○	●	○	●	○	○	
NOITE	-	-	-	-								
Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia				
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-				
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Furadeira	Retro-Escav.	Cam. Munk				
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-				

Atividades Realizadas

Descrição	Observação
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (ITEM 1.2.1): Serviço executado na casa de nº 86	Início da Execução em 23/10/2025

Ocorrências

21/10/2025: Não havia trabalhadores no local e não foi registrado nenhuma atividade na obra.
23/10/2025: retomada dos trabalhadores na obra. Em relação à CI nº 322/2025, que solicita justificativa da contratada sobre a execução do reaterro por trás do imóvel de nº 46 sem a construção do muro de contenção, informamos o seguinte: durante visita in loco, a engenheira da Contratada afirmou que foi realizado esse serviço devido a mudança do gestor do contrato e que foi executado sem gerar custo para a contratante, informou ainda que o serviço em questão será executado em estrita conformidade com as orientações previamente encaminhadas.

Comentários

Em 23/10/2025, a Defesa Civil esteve na Rua 25 e 26 vistoriando as frentes de serviço dos muros de Contenção e será emitido e enviado para a Secretaria de Infraestrutura um parecer técnico referente as demolições que não foram previstos na planilha licitada.

Imagens



FOTO 01



FOTO 02

BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO:09185588407
Assinado de forma digital por BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO:09185588407
Dados: 2025.12.03 16:16:20 -03'00'

Construtora LSG - Eng^a Bruna Nascimento-
CREA nº 1819500357PE

 Documento assinado digitalmente
MARIANA ALVES GONCALVES
Data: 04/12/2025 15:35:02-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Fiscalização: Mariana Alves
Mat. 47.463

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 10

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 2 DAS ÁREAS DE OBRAS 6N, 7N E 08.

Contrato 135/2024 **OS** 007/2024 **Convênio** 0402.320-73/2012

Endereço VILA TORRES GALVÃO E MARANGUAPE I.

Responsável Técnico BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **CREA/CAU** 1819500357PE **Ref. ao Período**

Responsável BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Função** Eng^a Civil **27/10/2025 a**

Início da Obra 13/06/2024 **Término da Obra** 12/12/2025 **31/10/2025**

Condição do tempo	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL	Dia da Visita - 29/10/25						
MANHÃ	-	-	-	-	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
TARDE	X	-	-	-	○	○	○	●	○	○	○
NOITE	-	-	-	-							
Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia			
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Furadeira	Retro-Escav.	Cam. Munk			
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Atividades Realizadas

Descrição	Observação
DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO (ITEM 1.2.5): Serviço executado na casa de nº 86; DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (ITEM 1.2.4): Serviço executado na casa de nº 86;	Início da Execução dos serviços

Ocorrências

Comentários

Imagens

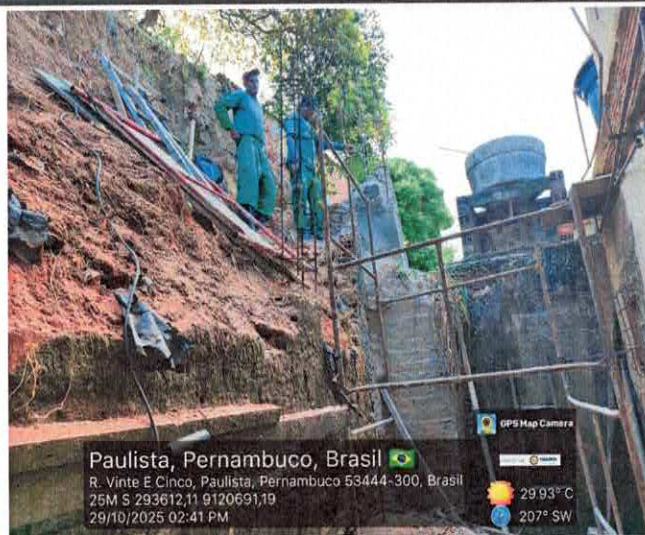


FOTO 01

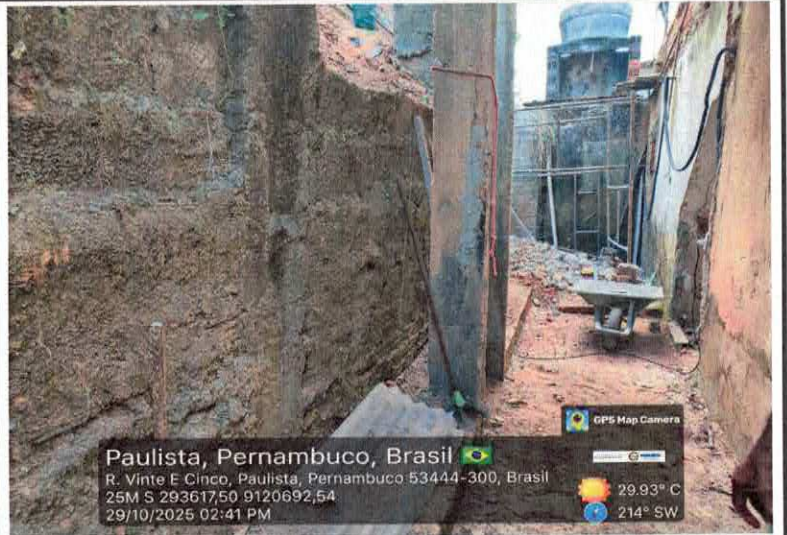


FOTO 02

BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO:09185588407
Assinado de forma digital por BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO:09185588407
Dados: 2025.12.03 16:16:05 -03'00'

Construtora LSG - Eng^a Bruna Nascimento-
CREA nº 1819500357PE

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARIANA ALVES GONCALVES**
Data: 04/12/2025 15:33:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Fiscalização: Mariana Alves
Mat. 47.463

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 11

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 2 DAS ÁREAS DE OBRAS 6N, 7N E 08 .

Contrato 135/2024 **OS** 007/2024 **Convênio** 0402.320-73/2012

Endereço VILA TORRES GALVÃO E MARANGUAPE I.

Responsável Técnico BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **CREA/CAU** 1819500357PE **Ref. ao Período**

Responsável BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Função** Engª Civil **03/11/2025 a**

Início da Obra 13/06/2024 **Término da Obra** 12/12/2025 **07/11/2025**

Condição do tempo	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL	Dia da Visita - 04/11/2025							
MANHÃ	-	-	-	-	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	
TARDE	X	-	-	-	○	○	●	○	○	○	○	
NOITE	-	-	-	-								
Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia				
Quantidade	1	-	-	-	-	-	3					
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Martelete	Retro-Escav.	Cam. Munk				
Quantidade	-	-	-	-	-	1	-	-				

Atividades Realizadas

Descrição	Observação
1.2.4. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	1.2.5 Continuação do Serviço por trás da casa de nº 86.
DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO.	

Ocorrências

Comentários

Imagens

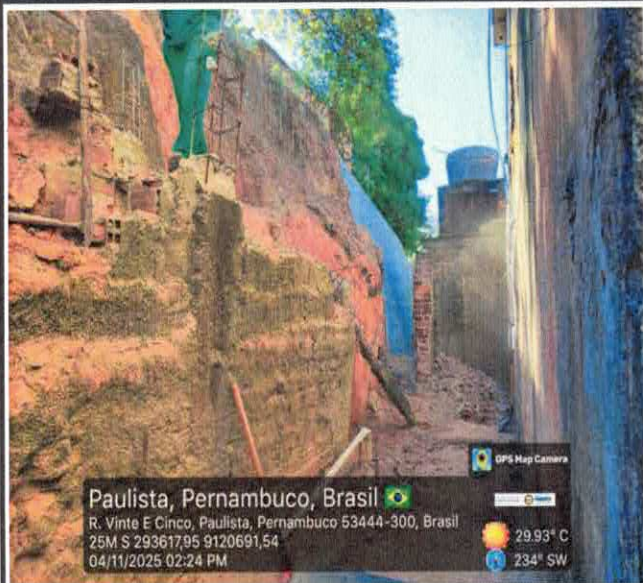


FOTO 01

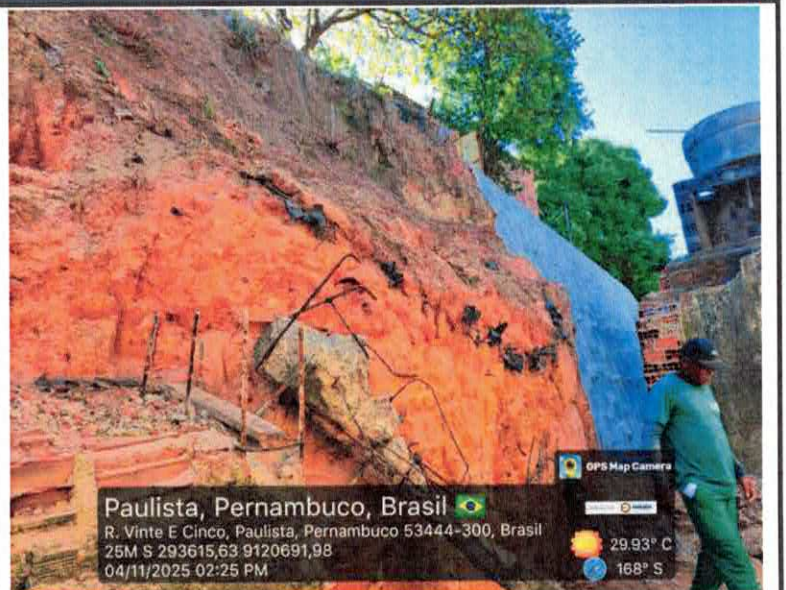


FOTO 02

BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA
NASCIMENTO:09185588407
Assinado de forma digital por BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO:09185588407
Dados: 2025.12.03 16:15:54 -03'00'

Construtora LSG - Engª Bruna Nascimento-
CREA nº 1819500357PE

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARIANA ALVES GONCALVES**
Data: 04/12/2025 15:32:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Fiscalização: Mariana Alves
Mat. 47.463

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 11

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 2 DAS ÁREAS DE OBRAS 6N, 7N E 08.

Contrato 135/2024 **OS** 007/2024 **Convênio** 0402.320-73/2012

Endereço VILA TORRES GALVÃO E MARANGUAPE I.

Responsável Técnico BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **CREA/CAU** 1819500357PE **Ref. ao Período**

Responsável BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Função** Engª Civil **10/11/2025 a**

Início da Obra 13/06/2024 **Término da Obra** 12/12/2025 **14/11/2025**

Condição do tempo	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL	Dia da Visita - 10/11/2025 e 13/11/2025							
MANHÃ	-	-	-	-	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	
TARDE	X	-	-	-	○	●	○	○	○	○	○	
NOITE	-	-	-	-								
Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia				
Quantidade	1	-	-	-	-	-	3					
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Martelete	Retro-Escav.	Cam. Munk				
Quantidade	-	-	-	-	-	1	-	-				

Atividades Realizadas

Descrição	Observação
1.2.4. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	Continuação do Serviço por trás da casa de nº 86.

Ocorrências

Comentários

10/11/2025: Continuação da Demolição da alvenaria existente.

13/11/2025: A demolição foi finalizada e no momento está aguardando a equipe de escavação para dar continuidade nos serviços.

Imagens



FOTO 01



FOTO 02

BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA
NASCIMENTO:09185588407
Assinado de forma digital por
BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA
NASCIMENTO:09185588407
Dados: 2025.12.03 16:15:44 -03'00'

Construtora LSG - Engª Bruna Nascimento-
CREA nº 1819500357PE

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARIANA ALVES GONCALVES**
Data: 04/12/2025 15:31:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscalização: Mariana Alves
Mat. 47.463

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 11

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 2 DAS ÁREAS DE OBRAS 6N, 7N E 08.

Contrato 135/2024 **OS** 007/2024 **Convênio** 0402.320-73/2012

Endereço VILA TORRES GALVÃO E MARANGUAPE I.

Responsável Técnico BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **CREA/CAU** 1819500357PE **Ref. ao Período**

Responsável BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Função** Engª Civil **17/11/2025 a**

Início da Obra 13/06/2024 **Término da Obra** 12/12/2025 **21/11/2025**

Condição do tempo	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL	Dia da Visita - 18/11/2025							
MANHÃ	-	-	-	-	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	
TARDE	X	-	-	-	○	○	●	○	○	○	○	○
NOITE	-	-	-	-								
Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia				
Quantidade	1	-	-	1	-	-	2					
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Furadeira	Retro-Escav.	Cam. Munk				
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-				

Atividades Realizadas

Descrição	Observação
1.2.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	Continuação da Escavação.

Ocorrências

Comentários

Imagens

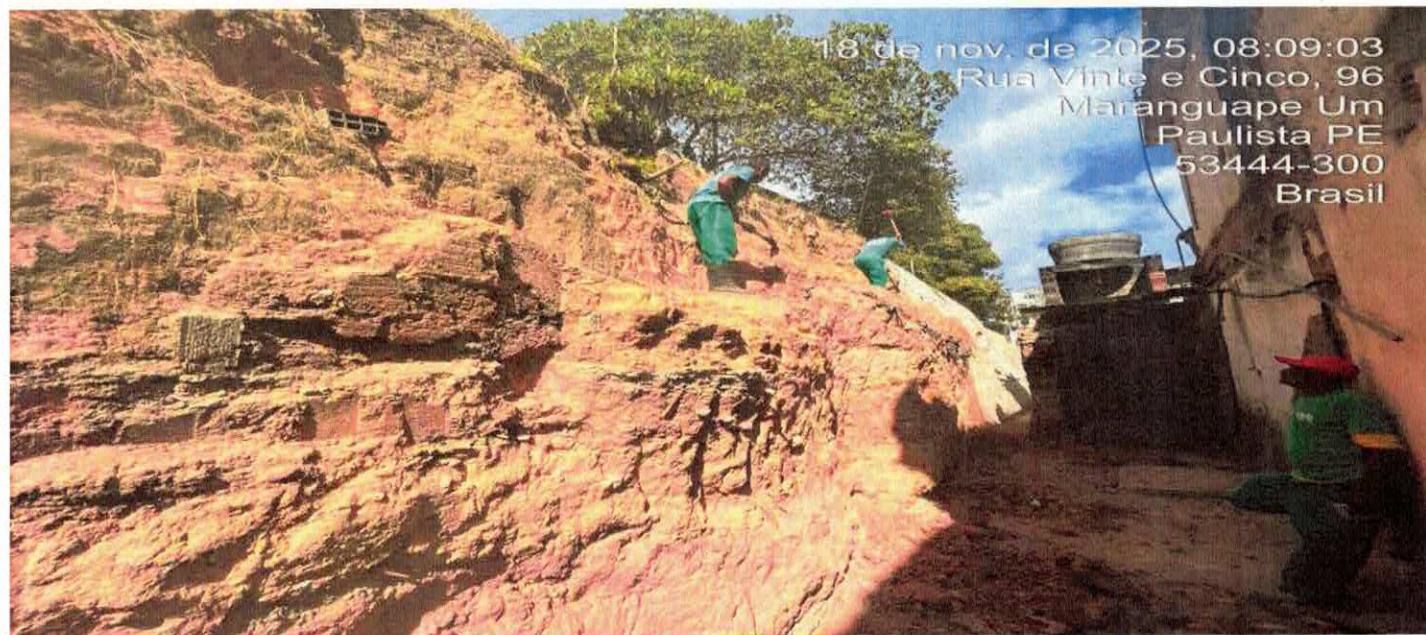


FOTO 01

BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA
NASCIMENTO:09185588407

Assinado de forma digital por
BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA
NASCIMENTO:09185588407
Dados: 2025.12.03 16:15:33 -03'00'

Construtora LSG - Engª Bruna Nascimento-
CREA nº 1819500357PE



Documento assinado digitalmente

MARIANA ALVES GONCALVES

Data: 04/12/2025 15:30:38-0300

Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

Fiscalização: Mariana Alves
Mat. 47.463

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 11

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 2 DAS ÁREAS DE OBRAS 6N, 7N E 08.

Contrato 135/2024 **OS** 007/2024 **Convênio** 0402.320-73/2012

Endereço VILA TORRES GALVÃO E MARANGUAPE I.

Responsável Técnico BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **CREA/CAU** 1819500357PE **Ref. ao Período**

Responsável BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Função** Engª Civil **24/11/2025 a**

Início da Obra 13/06/2024 **Término da Obra** 12/12/2025 **28/11/2025**

Condição do tempo	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL	Dia da Visita - 24/11/2025							
MANHÃ	X	-	-	-	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	
TARDE	-	-	-	-	○	●	○	○	○	○	○	○
NOITE	-	-	-	-								
Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia				
Quantidade	1	-	-	1	-	-	3					
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Furadeira	Retro-Escav.	Cam. Munk				
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-				

Atividades Realizadas

Descrição	Observação
1.2.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	Continuação da Escavação na casa de nº86.

Ocorrências

Comentários

Imagens

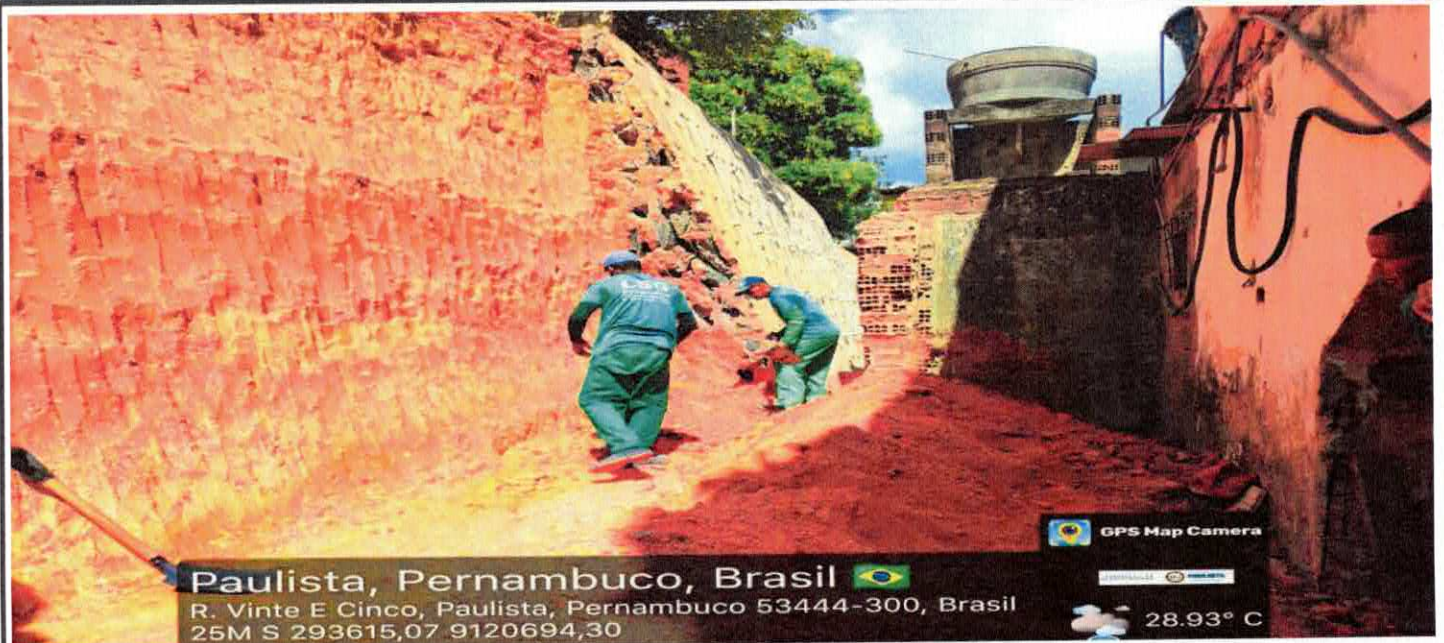


FOTO 01

BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO:09185588407
Assinado de forma digital por BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO:09185588407
Dados: 2025.12.03 16:15:22 -03'00'

Construtora LSG - Engª Bruna Nascimento-
CREA nº 1819500357PE



Documento assinado digitalmente
MARIANA ALVES GONCALVES
Data: 04/12/2025 15:29:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscalização: Mariana Alves
Mat. 47.463
